

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и транспорта  
Ненецкого автономного округа



  
В.В. САУТИНА  
2018 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
о ходе реализации и оценке эффективности  
государственной программы Ненецкого автономного округа  
**«Энергоэффективность и развитие энергетики в  
Ненецком автономном округе»**

за 2017 год

Ответственный исполнитель: Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

СОГЛАСОВАН:


Соисполнитель: по государственной программе Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» соисполнителей не предусмотрено

Дата составления отчета: «28» сентября 2018 г.


Исполнитель: ведущий консультант отдела реализации государственных программ управления государственных программ и приоритетных проектов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа - Шистерова А.В., тел. (818-53) 2-19-18, [ashisterova@ogvnao.ru](mailto:ashisterova@ogvnao.ru)

**СОГЛАСОВАНИЕ:**


**Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики и транспорта  
ДС и ЖКХ НАО**

 П.А. Масюков


**Заместитель начальника  
организационно-правового  
управления ДС и ЖКХ НАО –  
начальник бюджетного сектора**

 Л.М. Хабарова

**Начальник управления  
государственных программ и  
приоритетных проектов  
ДС и ЖКХ НАО**


 Е.М. Корельская

**Заместитель начальника управления  
государственных программ и  
приоритетных проектов – начальник  
отдела реализации  
государственных программ ДС и ЖКХ НАО**

 Е.Г. Соколова

**Исполнитель:**

**Ведущий консультант отдела реализации  
государственных программ в управлении  
государственных программ и  
приоритетных проектов ДС и ЖКХ НАО**

 А.В. Шистерова

## **Раздел 1. Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»**

### **1.1. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) путем сопоставления планируемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий за отчетный год на основе плана реализации**

Общий объем ассигнований окружного бюджета, предусмотренный на реализацию государственной программы Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 416-п, (далее - государственная программа) в 2017 году составил 109 373,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовое исполнение составило 94 034,0 тыс. рублей или 86,0 % от объема финансирования, предусмотренного в отчетном периоде, фактическое исполнение - 91 999,6 тыс. рублей или 97,8 % от кассового исполнения.

В 2017 году в рамках государственной программы реализованы следующие мероприятия:

#### **Подпрограмма 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»**

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2017 году предусмотрены средства окружного бюджета в объеме 10 114,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 8 381,9 тыс. рублей или 82,9 % от объема финансирования, предусмотренного в отчетном периоде, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 8 381,9 тыс. рублей или 100 % от кассового исполнения.

В рамках подпрограммы 1 реализовано следующее мероприятие:

#### **Основное мероприятие 3 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения»**

В рамках реализации основного мероприятия 3 казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» (далее - КУ НАО «ЦСЗ») в 2017 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 10 114,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 8 381,9 тыс. рублей или 82,9 % от объема финансирования, предусмотренного в отчетном периоде, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 8 381,9 тыс. рублей или 100 % от кассового исполнения.

В отчетном периоде в составе основного мероприятия 3 «Строительство и реконструкция объектов тепло- и электроснабжения» подпрограммы 1 предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Разработка проектной документации на строительство объекта «Котельная в п. Искателей» (КУ НАО «ЦСЗ»)

На мероприятие предусмотрено средств окружного бюджета в 2017 году в размере 7 476,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 7 476,6 тыс. рублей или 100 % от объема финансирования, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 7 476,6 тыс. рублей или 100% от кассового исполнения.

23.09.2016 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «Тепломех» заключен государственный контракт № 0184200000616000183 на разработку проектной документации, срок исполнения государственного контракта - 11.04.2017, сумма государственного контракта определена в размере 6 237 тыс. рублей.

26.05.2017 года получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. В декабре 2017 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Произведена оплата за оказание услуг Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, проверки достоверности сметной стоимости строительства.

Полный комплект проектной документации предоставлен, расчет с подрядчиком произведен, мероприятие выполнено.

Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский с разработкой ПСД (КУ НАО «ЦСЗ»)

На мероприятие предусмотрено средств окружного бюджета в 2017 году в размере 250,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 250,0 тыс. рублей или 100 % от объема финансирования, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 250,0 тыс. рублей или 100 % от кассового исполнения.

Произведена оплата за оказание услуг ООО «Геосервис» по межеванию земельного участка.

06.08.2012 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО «ТрансПроект-Инжиниринг» заключен государственный контракт № 25 на разработку проектной документации, срок исполнения государственного контракта - 01.03.2013, сумма государственного контракта определена в размере 5 423,83 тыс. рублей. По настоящее время контракт не исполнен, результат работ не получен.

Проектировщиком в 2012 году было предложено на выбор два варианта проложения трассы линии электропередачи. Решение о выборе наиболее допустимого варианта было принято только в январе 2013 года. Проектная документация получена 11.06.2013 для прохождения входного контроля, при проверке проекта было выявлено большое количество замечаний.

В ноябре 2013 года ООО «ТрансПроектИнжиниринг» обратилось в Суд в связи с отсутствием оплаты этапа «Проектирование». Суд не удовлетворил иск подрядчика. Подрядчиком подготовлены акты выбора земельных участков. В адрес учреждения поступило постановление о предварительном отводе земли. 14.05.2014 материалы переданы проектировщику для проведения землеустроительных работ. В связи с невыполнением работ подрядчиком, направлено исковое заявление в суд об обязанности подрядчика в 3-х месячный срок передать заказчику проект с положительным заключением государственной экспертизы и взыскании неустойки за нарушение сроков государственного контракта в сумме 1 513,3 тыс. рублей.

По итогам судебных разбирательств в течение 2015 и 2016 годов в апелляционной и кассационной инстанциях подрядчику было вменено исполнение

государственного контракта. В мае 2017 года направлено исковое заявление в суд о расторжении государственного контракта и возврате ранее оплаченных работ. В июле 2017 года по решению суда государственный контракт с подрядчиком расторгнут.

Модульная котельная и сети теплоснабжения в п. Каратайка, разработка проектной документации (КУ НАО «ЦСЗ»)

На мероприятие предусмотрено средств окружного бюджета в 2017 году в размере 2 388,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 655,3 тыс. рублей или 27,4% % от объема финансирования, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 655,3 тыс. рублей или 100% от кассового исполнения.

Произведена оплата услуг по межеванию дополнительного земельного участка, выплачено авансирование работ в размере 100 % за оказание услуг по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации.

02.10.15 между КУ НАО «ЦСЗ» и ООО ЭК «Паритет» (прежнее наименование - ООО «Белэлектромонтажналадка») заключен государственный контракт на разработку проектной документации, срок исполнения государственного контракта – июнь 2016 года, сумма государственного контракта 1 607,8 тыс. рублей.

10.05.2016 принято судебное решение об одностороннем отказе КУ НАО «ЦСЗ» от исполнения государственного контракта, 25.05.2016 года ООО ЭК «Паритет» подало исковое заявление с требованием об отмене решения, иск удовлетворен судом. КУ НАО «ЦСЗ» направило апелляционную жалобу, вынесено судебное решение о продолжении исполнения государственного контракта.

01.11.2016 подрядчику выдана доверенность на направление проектной документации на государственную экспертизу. 16.01.2017 ООО ЭК «Паритет» направил уведомление в адрес КУ НАО «ЦСЗ» о необходимости дополнительного отвода земельного участка для возможности размещения топливного склада. 01.03.2017 года получено распоряжение от УИЗО НАО об образовании земельного участка.

20.04.2017 направлена очередная претензия в адрес ООО ЭК «Паритет» в связи с отставанием от запланированных сроков. 15.06.2017 градостроительный план земельного участка передан ООО ЭК «Паритет» для дальнейшей работы.

В сентябре 2017 года заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации. В ходе проверки подрядчику выставлены замечания со сроком устранения до 14 ноября 2017 года. На отчетную дату замечания подрядчиком не устранены.

11.12.2017 подрядчику направлено предложение о расторжении государственного контракта, а также об оплате неустойки в размере 1 611,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма 2 «Газификация и газоснабжение на территории Ненецкого автономного округа»**

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2017 году предусмотрены средства окружного бюджета в объеме 99 258,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 85 652,1 тыс. рублей или 86,3 % от объема

финансирования, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 83 617,7 тыс. рублей или 97,6 % от кассового исполнения.

В рамках подпрограммы 2 реализовано следующее мероприятие:

### **Основное мероприятие 3 «Организация газоснабжения на территории Ненецкого автономного округа»**

В рамках реализации основного мероприятия 3 в 2017 году предусмотрены средства окружного бюджета в размере 99 258,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 85 652,1 тыс. рублей или 86,3 % от объема финансирования, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 83 617,7 тыс. рублей или 97,6 % от кассового исполнения.

Разница фактического и кассового освоения средств субсидии обусловлена сроком исполнения обязательств, установленных условиями соглашения о перечислении субсидии на приобретение специализированной техники до 01.04.2018 г.

В отчетном периоде в составе основного мероприятия 3 «Организация газоснабжения на территории Ненецкого автономного округа» подпрограммы 2 предусмотрена реализация следующего мероприятия:

#### Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по газоснабжению потребителей на территории Ненецкого автономного округа

На мероприятие (приобретение имущества ОАО «Нарьян-Марокргаз» в государственную собственность Ненецкого автономного округа, специальной техники для технической эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления) предусмотрено средств окружного бюджета в 2017 году в размере 99 258,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 85 652,1 тыс. рублей или 86,3% от объема финансирования, фактическое освоение средств окружного бюджета в отчетном периоде составило 83 617,7 тыс. рублей или 97,6 % от кассового исполнения.

В соответствии с соглашением о предоставлении в 2017 году субсидии в виде государственной преференции от 26.04.2017 № 43 ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» (далее - ГУП НАО «НКК») в целях финансового обеспечения затрат по приобретению реализуемого на торгах имущества ОАО «Нарьян-Марокргаз» (сети и системы газоснабжения г. Нарьян-Мар и п. Красное) была предоставлена субсидия в размере 89 199,9 тыс. рублей. В июне 2017 года предоставлен отчет ГУП НАО «НКК» о расходовании средств субсидии в полном объеме с приложением подтверждающих документов о покупке имущества и постановке его на баланс предприятия.

В соответствии с пунктом 20 Порядка предоставления субсидии в виде государственной преференций, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2017 № 135-п, ГУП НАО «НКК» произведен возврат части субсидии (возврат налогов) в окружной бюджет в размере 13 606 764,41 рублей в установленный срок.

Согласно Порядку предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по газоснабжению потребителей на территории Ненецкого автономного округа в части приобретения специальной техники и оборудования,

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.10.2017 № 324-п, между Департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа и ГУП НАО «НKK» заключено соглашение от 15.11.2017 № 127 и предоставлена субсидия в размере 10 059,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 ГУП НАО «НKK» предоставлены отчеты о фактическом расходовании средств субсидии по целевому назначению в объеме 8 024 599,52 рублей с приложением подтверждающих документов. За счет средств субсидии в собственность ГУП НАО «НKK» за отчетный период приобретено 5 автомобилей для работы аварийной и ремонтной служб и 14 единиц специализированных приборов и оборудования, предназначенных для обслуживания газовых сетей.

### **1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение цели государственной программы**

Целями государственной программы являются развитие регионального энергетического комплекса, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ненецкого автономного округа, повышение экологической эффективности и безопасности на основе рационального и экологически ответственного использования энергии и ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение надежного газоснабжения потребителей Ненецкого автономного округа и повышение уровня газификации территории региона, увеличение домохозяйств подключенных к сетям централизованного газоснабжения.

Достижение целей государственной программы обеспечивалось, в том числе, путем вложения бюджетных инвестиций в проектирование объектов тепло- и электроснабжения.

В 2017 году в рамках государственной программы решены задачи по разработке проекта современной котельной для создания объекта теплоэнергетики с улучшенными технико-экономическими показателями работы оборудования, а также по приобретению сетей газоснабжения и газораспределительного оборудования ОАО «Нарьян-Марокргаз» в собственность Ненецкого автономного округа для повышения уровня стабильности газификации в регионе, для обеспечения надежного газоснабжения потребителей в будущем.

### **1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы с обоснованием отклонений по целевым показателям, плановые значения по которым не достигнуты**

Сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

По итогам 2017 года значения 7 из 8 целевых показателей (88% целевых показателей) выполнены с оценкой степени достижения плановых показателей более 95 %, 8 из 8 целевых показателей (т.е. 100% целевых показателей) выполнены с оценкой степени достижения плановых показателей более 75 %.

В связи с фактическими объемами поставок ресурсов и с ограниченными возможностями финансирования не достигнут в полном объеме плановый показатель:

- годовой объем поставляемого природного газа на 1 человека.

#### **1.4. Перечень отдельных и основных мероприятий государственной программы, выполненных в отчетном году в установленные сроки и в полном объеме согласно плану реализации**

В отчетном году в полном объеме и в установленные сроки выполнены три мероприятия из четырех, предусмотренных в рамках государственной программы, в том числе:

- два мероприятия подпрограммы 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»:

1) Разработка проектной документации на строительство объекта «Котельная в п. Искателей»;

2) Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский с разработкой ПСД.

- одно мероприятие подпрограммы 2 «Газификация и газоснабжение на территории Ненецкого автономного округа» фактически выполнено (при этом средства окружного бюджета освоены не в полном объеме):

- Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по газоснабжению потребителей на территории Ненецкого автономного округа.

Фактическим результатом реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе» за 2017 год является наличие утвержденного проекта в целях строительства объекта энергетического комплекса «Котельная в п. Искателей», наличие землеустроительной документации по межеванию земельного участка под строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский.

Фактическим результатом реализации мероприятий подпрограммы 2 «Газификация и газоснабжение на территории Ненецкого автономного округа» за 2017 год является увеличение доли протяженности газотранспортной системы, находящейся в собственности Ненецкого автономного округа. Ожидаемый результат реализации мероприятия в полном объеме достигнут.

#### **1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты реализации государственной программы с указанием не выполненных или выполненных не в полном объеме отдельных и основных мероприятий государственной программы, а также причин их невыполнения или выполнения не в полном объеме**

В 2017 году планировалось осуществить разработку проектной документации «Модульная котельная и сети теплоснабжения в п. Каратайка», причины повлиявшие на выполнение мероприятия отражены в полном объеме в пункте 1.1. раздела 1 настоящего отчета.

Достижение ожидаемого результата реализации мероприятий в полном объеме согласно Плана реализации мероприятий на 2017 год не представляется возможным в связи с расторжением двух государственных контрактов на проектирование объектов: Модульная котельная и сети теплоснабжения в п. Каратайка; ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский.

#### **1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**



Отрицательным фактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, является отставание от сроков исполнения обязательств по государственным контрактам по проектированию объектов и расторжение государственных контрактов.

### **1.7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году**

Оценка эффективности реализации государственной программы произведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 03.10.2013 № 359-п, на основе:

1. Степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей государственной программы и их плановых значений.

По итогам 2017 года значения 7 из 8 целевых показателей (88% целевых показателей) выполнены с оценкой степени достижения плановых показателей более 95 %, 8 из 8 целевых показателей (т.е. 100% целевых показателей) выполнены с оценкой степени достижения плановых показателей более 75 %.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы.

В 2017 году уровень затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы составил 86 %.

3. Степени реализации мероприятий государственной программы, путем сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодного плана реализации государственной программы.

В 2017 году выполнено в полном объеме три мероприятия из четырех, предусмотренных государственной программой, что составляет 75% от запланированного объема мероприятий.

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» реализована в 2017 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

## **Раздел 2. Результаты реализации мер правового регулирования**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы, принятых в течение 2017 года, повлиявших позитивно на реализацию мероприятий:

1) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2017 № 135-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в виде государственной преференции государственному унитарному предприятию Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная компания»;

2) Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 26.10.2017 № 324-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности по газоснабжению потребителей на территории

Ненецкого автономного округа в части приобретения специальной техники и оборудования».

Принятые меры правового регулирования позволили заключить соглашение о перечислении субсидии в рамках подпрограммы 2, так как регулируют порядок предоставления субсидий, в том числе сроки финансирования и возврата бюджетных средств, а также направление их целевого использования.

### **Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы**

#### **3.1. Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию государственной программы**

Сведения о результатах использования бюджетных ассигнований окружного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы приведены в приложении 2 к настоящему отчету.

#### **3.2. Сведения о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными бюджетными и автономными учреждениями Ненецкого автономного округа по государственной программе**

В рамках государственной программы не предусмотрено оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ненецкого автономного округа.

### **Раздел 4. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу**

Сведения о внесенных изменениях в государственную программу приведены в приложении 3 к настоящему отчету.

### **Раздел 5. Презентация годового отчета об исполнении государственной программы**

Презентация годового отчета об исполнении государственной программы представлена в электронном виде в формате «pptx.».

Исполняющий обязанности  
руководителя Департамента



В.В. Саутина

Сведения  
о достижении целевых показателей государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»

в 2017 году

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей государственной программы (подпрограмм)			Абсолютное отклонение (+, -)	Оценка степени достижения целей и задач государственной программы (фактическое значение целевого показателя/плановое значение целевого показателя) (в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Ненецкого автономного округа), в %	Обоснование отклонений значения целевого показателя на конец отчетного года
		Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»							
Подпрограмма 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»							
Показатель № 1 Удельный расход топлива на выработку электроэнергии на ДЭС	г/кВт.ч	291	311,6	280,0	-31,6	111,3	
Показатель № 2 Годовой объем завозимого каменного угля на 1 человека	тонн	1,23	1,53	1,29	-0,24	118,6	
Показатель № 3 Годовой объем завозимого дизельного топлива на 1 человека	тонн	0,82	0,83	0,75	-0,08	110,7	
Показатель № 4 Доля потерь электроэнергии в электросетях	%	10,8	9,39	9,10	-0,29	103,2	
Подпрограмма 2 «Газификация и газоснабжение на территории Ненецкого автономного округа»							
Показатель № 5 Годовой объем поставляемого природного газа на 1 человека	м <sup>3</sup>	2600	3055	2810	-245	92,0	Фактический объем поставляемого природного газа на 1 человека (в связи с ограниченными возможностями финансирования)
Показатель № 6 Протяженность газотранспортной системы	км	194,3	177,1	194,3	17,2	110	
Показатель № 7 Увеличение доли газа в топливном балансе региона	%	75	75	75	0	100	
Показатель № 8 Доля протяженности газотранспортной системы, находящейся в собственности Ненецкого автономного округа	%	-	40,0	41,0	1,0	102,5	

Сведения  
о результатах использования бюджетных ассигнований окружного  
бюджета и иных средств на реализацию государственной  
программы Ненецкого автономного округа  
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»

за 2017 год

Наименование государственного контракта, соглашения, участка	Срок начала реализации мероприятия	Срок окончания реализации мероприятия	Объем финансирования государственной программы (тыс. руб.)										% выполнения объема средств окружного бюджета в объеме средств федерального бюджета в период по состоянию на 31.12.2017	% фактического исполнения средств окружного бюджета в объеме средств федерального бюджета в период по состоянию на 31.12.2017	Оценка степени соответствия запланированным условиям затрат и эффективности использования средств окружного бюджета в объеме средств федерального бюджета в период по состоянию на 31.12.2017 (в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа), в %					
			Затрачено					Кассовое исполнение												
			в том числе:			в том числе:		в том числе:			в том числе:									
			итого	федеральный бюджет	окужной бюджет	местные бюджеты	иные источники	итого	федеральный бюджет	окужной бюджет	местные бюджеты	иные источники				итого	федеральный бюджет	окужной бюджет	местные бюджеты	иные источники
Внебюджетная программа Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	109 373,7	-	109 373,7	-	-	-	-	94 034,0	-	94 034,0	-	-	91 999,6	-	91 999,6	-	-	86,0	97,8	86,0
В том числе:	0	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	86,0	97,8	86,0
	109 373,7	-	109 373,7	-	-	-	-	94 034,0	-	94 034,0	-	-	91 999,6	-	91 999,6	-	-	86,0	97,8	86,0
Подпрограмма 1 «Развитие энергетического комплекса в Ненецком автономном округе»	2014	2017	10 114,8	-	10 114,8	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	82,9	100	82,9
	10 114,8	-	10 114,8	-	-	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	82,9	100	82,9
Организованная компания «Девлармэг» осуществляет жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и транспорта Ненецкого автономного округа	2015	2017	10 114,8	-	10 114,8	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	82,9	100	82,9
	10 114,8	-	10 114,8	-	-	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	82,9	100	82,9
Участник КУ НАО «Центральный завод»	2014	2019	10 114,8	-	10 114,8	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	82,9	100	82,9
	10 114,8	-	10 114,8	-	-	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	8 381,9	-	8 381,9	-	-	82,9	100	82,9
Разработка проектной документации на строительство объекта «Котельная в п. Исрава»	2014	2019	7 476,6	-	7 476,6	-	-	7 476,6	-	7 476,6	-	-	7 476,6	-	7 476,6	-	-	100	100	100
	7 476,6	-	7 476,6	-	-	-	-	7 476,6	-	7 476,6	-	-	7 476,6	-	7 476,6	-	-	100	100	100
Строительство ДЭП в Хорей-Вер - п. Харьявский с газификацией ПСД	2014	2017	2 388,2	-	2 388,2	-	-	655,3	-	655,3	-	-	655,3	-	655,3	-	-	27,4	100	27,4
	2 388,2	-	2 388,2	-	-	-	-	655,3	-	655,3	-	-	655,3	-	655,3	-	-	27,4	100	27,4
Модернизация котельной и сети теплоснабжения в п. Каратайка, разработка проектной документации	2014	2019	99 238,9	-	99 238,9	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
	99 238,9	-	99 238,9	-	-	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
В том числе:	99 238,9	-	99 238,9	-	-	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
	99 238,9	-	99 238,9	-	-	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
Организованная компания «Девлармэг» осуществляет жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика и транспорта Ненецкого автономного округа	2017	2017	99 238,9	-	99 238,9	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
	99 238,9	-	99 238,9	-	-	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
Создание мероприятия 3 «Организация газообогрева на территории Ненецкого автономного округа»	2017	2017	99 238,9	-	99 238,9	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
	99 238,9	-	99 238,9	-	-	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
Участник ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания»	2017	2017	99 238,9	-	99 238,9	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
	99 238,9	-	99 238,9	-	-	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по газификации потребителей на территории Ненецкого автономного округа	2017	2017	99 238,9	-	99 238,9	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3
	99 238,9	-	99 238,9	-	-	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	83 617,7	-	83 617,7	-	-	86,3	97,6	86,3

Сведения  
о внесенных изменениях в государственную программу  
Ненецкого автономного округа  
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»

в 2017 году

№ п/п	Вид и наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»	03.03.2017	59-п	Приведение целевых показателей государственной программы и объемов бюджетных ассигнований по мероприятиям в соответствие с законом Ненецкого автономного округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
2	Постановление Администрации НАО «О внесении изменений в государственную программу Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе»	12.07.2017	229-п	Приведение структуры государственной программы в соответствие с постановлением Администрации НАО «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» от 23.07.2014 № 267-п в редакции постановления Администрации НАО от 12.05.2017 № 152-п, приведение целевых показателей государственной программы и объемов бюджетных ассигнований по мероприятиям в соответствие с законом Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции закона Ненецкого автономного округа от 24.04.2017 № 313-оз

ОГОНЬ

об исполнении федеральных программ

Челябского автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Челябинском автономном округе»

за 2017 год




Государственная программа Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» утверждена постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 416-п (с изменениями внесенными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.07.2017 № 229-п)

**Ответственный исполнитель государственной программы:** Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

**Участники государственной программы:**




- Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого автономного округа;
- Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Администрация МО «Муниципальный район «Заполярный район»;
- КУ НАО «Централизованный стройказначик»

**Срок реализации государственной программы:** 2014 – 2017 годы





**Цель государственной программы:** Создание условий для гарантированного обеспечения энергоресурсами потребителей Ненецкого автономного округа

**Задача государственной программы:** Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства и использования топливно-энергетических ресурсов





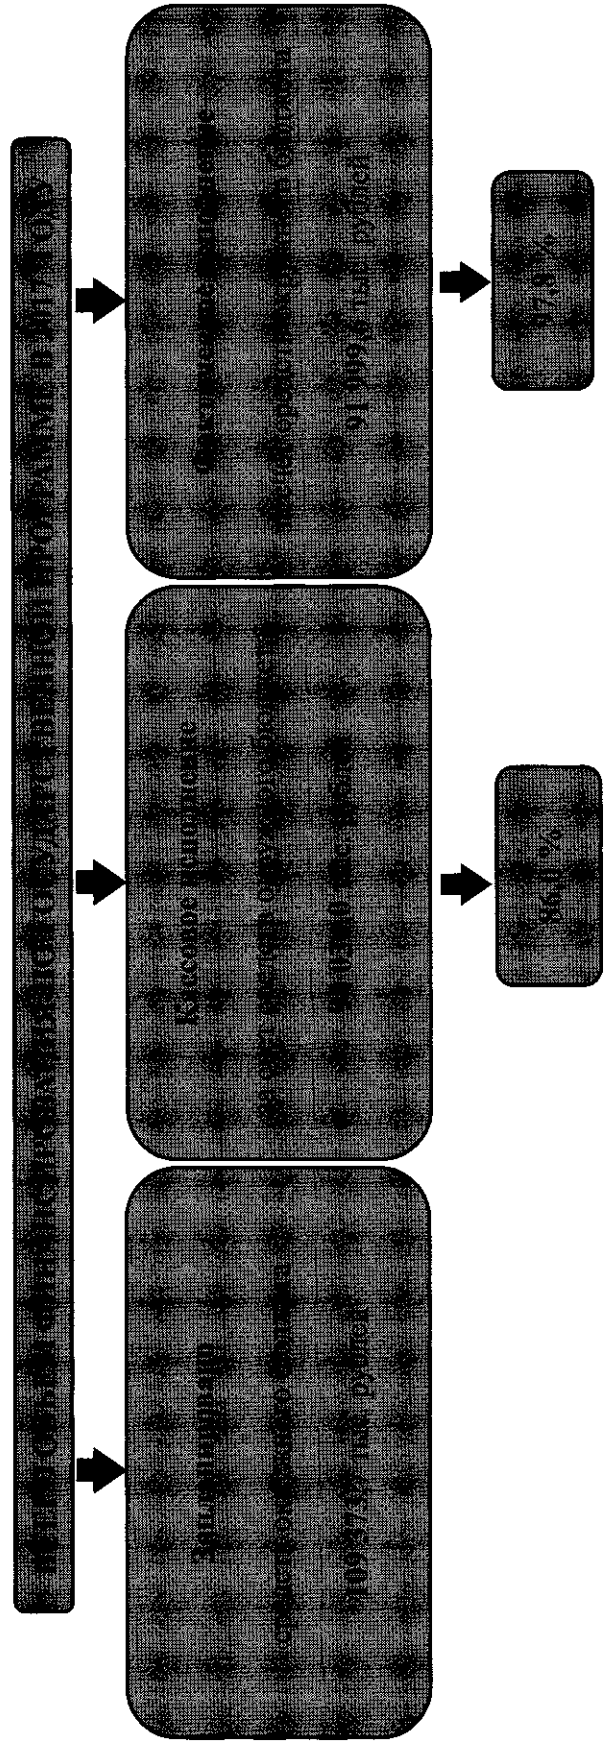

1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**  
 10. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 11. **PRODUCTION**  
 12. **SALES AND MARKETING**  
 13. **ADMINISTRATION**  
 14. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 15. **PERSONNEL**  
 16. **LEGAL**  
 17. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 18. **CONSTRUCTION**  
 19. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 20. **PRODUCTION**  
 21. **SALES AND MARKETING**  
 22. **ADMINISTRATION**  
 23. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 24. **PERSONNEL**  
 25. **LEGAL**  
 26. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 27. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**

001/1/1/1

002/1/1/1

003/1/1/1



1. **RESEARCH AND DEVELOPMENT**  
 2. **PRODUCTION**  
 3. **SALES AND MARKETING**  
 4. **ADMINISTRATION**  
 5. **FINANCE AND ACCOUNTS**  
 6. **PERSONNEL**  
 7. **LEGAL**  
 8. **PLANT AND EQUIPMENT**  
 9. **CONSTRUCTION**


3. Оценка степени выполнения целей и решения задач государственной программы за отчётный год - **88%** (из 8 показателей все показатели выполнены более чем на 75 %, что составляет 100% от общего количества показателей государственной программы, из них 7 выполнены более чем на 95% от плана);
- \* Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы за отчётный год – **86,0%**;
  - \* Оценка степени реализации мероприятий государственной программы за отчётный год – **75%** (3 из 4 мероприятий государственной программы, в рамках запланированного объема работ, выполнены в полном объеме).

По результатам оценки уровень эффективности реализации государственной программы оценивается как удовлетворительный.


1) Модульная конференция в сети телескопическими в п. Карыгайса, разработка проектной документации (27,1%)

\* Целевые показатели с уровнем достижения менее 75% отсутствуют.

### 5. Основные результаты реализации государственной программы в 2017 году







**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**
